



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Programa: Agua Potable del cantón Pedro Moncayo

Proyecto: Ejecutar varios proyectos de agua potable en beneficio de la población

Descripción del proyecto: Es de prioridad la datación de agua potable a la población del cantón, ya que las zonas urbanas consolidadas, tanto de la Cabecera Cantonal como de las parroquias rurales, se encuentran abastecida de infraestructura básica en un alto porcentaje, mientras que en los asentamientos humanos dispersos existe déficit de estos servicios en las parroquias con los siguientes porcentajes: Tabacundo con el 88,3%, en La Esperanza con el 89,3%, en Malchingui con el 87,3%, en Tocachi con el 78% y en Tupigcachi con el 41%.


Objetivo: Fortalecer la provisión y control del servicio público de agua potable y alcantarillado, para garantizar el acceso sostenible a el agua para consumo humano con estándares de calidad

Alcanzar al menos el 53% de viviendas con abastecimiento de agua por tubería en su interior, hasta el 2019.

Ejecutar obras de mejoramiento y mantenimiento de agua segura en las parroquias del cantón Pedro Moncayo.

Seguimiento: HITOS DEL PROYECTO

Para avance programático			Ejecución					
Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(%)	Fecha logro	
1	Gestion de 7 Procesos Precontractuales de los Proyectos de agua segura para el consumo humano del cantón Pedro Moncayo	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	20,00	Porcentaje	100	1%	x	31-01-18
2	Transferencia de fondo a la Empresa EMASA PM	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10,00	Porcentaje	100	0		
3	Contratación de la obra de construcción de sectorización de agua potable en barrios de Tabacundo Fase I	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10,00	Porcentaje	100	0		
4	Adquisición de materiales para implementar el proyecto de agua potable Chinchigloma	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10,00	Porcentaje	100	5	x	30/03/2018
5	Construcción de 8 tanques de reserva de agua potable parroquia Malchingui	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10,00	Porcentaje	100	15	x	30/03/2018
6	Contratación de la obra de construcción de 3 plantas de tratamiento de agua potable en el centro de Tocachi	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10,00	Porcentaje	100	0		
7	Contratación de construcción de la obra de mejoramiento extensión agua potable (Tocachi)	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10,00	Porcentaje	100	0		
8	Contratación de construcción de la obra de mejoramiento extensión agua potable (Tocachi)	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10,00	Porcentaje	100	5	x	30/03/2018
9	Informes y/o planillas y acta entrega recepción de las obras	Informes y/o planillas Acta entrega recepción	10,00	Porcentaje	100			
Avance financiero			Codificado					
GAD MPM			Inicial		Reforma		Ejecutado	
\$			532.548,63					

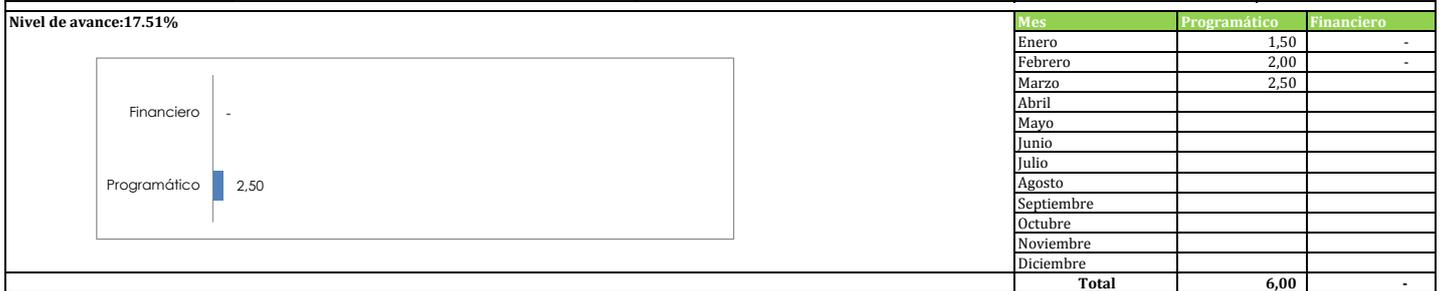

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2018	Avances: Se cuenta con los proyectos que fueron declarados cierto en el año anterior, se esta realizando la actualización de los precios para precios unitarios poder realizar el proceso pre-contractual	Carlos Buitrón	30/01/2018
	Problemas y soluciones implementadas: Se esta realizando la actualización de los precios unitarios		
Febrero, 2018	Avances: Se ha pasado el proceso de la construcción de 8 tanques de Agua a la Dirección de Compras Públicas para realizar el respectivo proceso Contractual	Carlos Buitrón	28/02/2018
	Problemas y soluciones implementadas: Se esta realizando la actualización de los precios unitarios		
Marzo, 2018	Avances: Se ha recibido el proyecto de adquisición de materiales de Chinchigloma, misma que esta en revision ya que Emasa pasa como proyecto y no como adquisicion solo de materiales	Carlos Buitrón	30/03/2018
	Problemas y soluciones implementadas: Se espera que desde Emasa, no ayuden con los procesos para poder continuar con la revisión de los mismos		
