




FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

<b>Programa</b>	Agua Potable	
<b>Proyecto</b>	Canal de Riego Pesillo Imbabura	
<b>Descripción del proyecto</b>	<p>El cantón Pedro Moncayo forma parte del proyecto de la Subsecretaría de Servicios de Agua Potable y Saneamiento Pesillo-Imbabura para atender la gran demanda de las comunidades rurales del sector y lograr servicios continuos con agua de calidad adecuada para el consumo humano que mejoren las condiciones de salud y el nivel de vida de la población.</p> <p>El proyecto consta de dos componentes:</p> <p>El Sistema Regional de Agua Potable Pesillo; y,</p> <p>La Rehabilitación y Mejoramiento de los 52 sistemas de agua potable rurales.</p> <p>COMPONENTE 1: Constituido por el Sistema Regional de Agua Potable Pesillo-Imbabura, el cual se encuentra en la fase de reformulación de estudios y diseños, que beneficiarán a varias comunidades de los cantones: Ibarra, Otavalo y Antonio Ante en la provincia de Imbabura; Pedro Moncayo y Cayambe en la provincia de Pichincha.</p> <p>COMPONENTE 2: Está orientado a la construcción de obras de rehabilitación y mejoramiento de 52 sistemas comunitarios de agua potable; localizados en el área de influencia del Proyecto Regional Pesillo-Imbabura.</p> <p>Línea de Base</p> <p>Cobertura media de 55.21 % del área de intervención; calidad del servicio en estado aceptable, déficit actual de 119,2 l/s.</p> <p>Beneficiando 150 comunidades de las 2 Provincias en los 4 Cantones,</p>	<p><b>Objetivo:</b></p> <p>Mejorar y Rehabilitación de plantas de tratamiento, Reemplazar filtros, Sistemas de desinfección, Reparación integral de estructuras, Construcción de nuevas plantas de tratamiento, Tanques de sedimentación, Filtros, Flotadores, Aireadores, Instalaciones de desinfección. Ampliación de Redes, Ampliación de Sistemas de almacenamiento, Reposición de redes y accesorios, Rehabilitación de conducción y redes, Implementación de nuevas fuentes de abastecimiento de agua cruda, Mejoramiento de los sistemas de almacenamiento. Este proyecto contempla la rehabilitación de 52 sistemas de agua potable que benefician a más de 150 comunidades localizadas en las provincias de Imbabura y Pichincha en los cantones de Pedro Moncayo, Cayambe, Antonio Ante y Otavalo</p> <p>Ejecutar obras de vialidad y conectividad así como el mantenimiento de las vías a nivel de las parroquias del cantón Pedro Moncayo.</p>

<b>Seguimiento</b>	<b>HITOS DEL PROYECTO</b>				
	<b>Para avance programático</b>			<b>Ejecución</b>	
	<b>Detalle</b>	<b>Medio de verificación</b>	<b>Pond. %</b>	<b>Unidad</b>	<b>Meta</b>
	1	Gestión de 1 Procesos de Control y Aporte Financiero Cantonal	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	Porcentaje	100
					1
					x
					31-01-18
	2	Proyecto Regional de agua potable Pesillo - Imbabura	Convenio Informes técnicos Solicitud de Transferencia Respaldo de Transferencia	Porcentaje	100
					10
					x
					30/03/2018
	<b>Avance financiero</b>			<b>Codificado</b>	
				<b>Inicial</b>	<b>Reforma</b>
	GAD MPM			\$	278.373,16
				<b>Ejecutado</b>	-

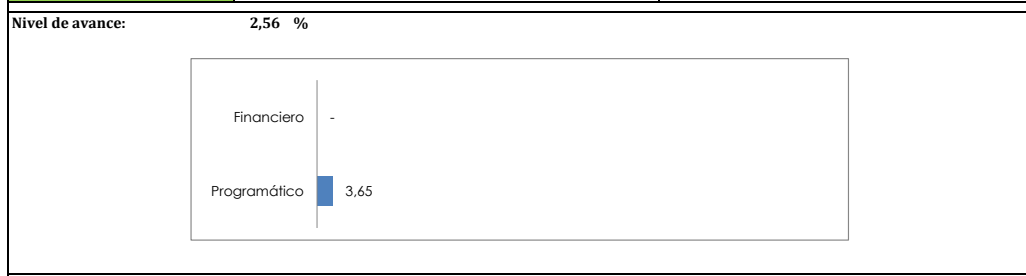

Mes	Programático	Financiero
Enero	3,50	-
Febrero	3,50	-
Marzo	3,50	-
Abril	3,65	-
Mayo		
Junio		
Julio		
Agosto		
Septiembre		
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		

<b>Resumen narrativo:</b>		<b>Actualizado por:</b>	<b>Fecha:</b>
Enero, 2018:	<p><b>Avances:</b> Da inicio los trabajos en el Canal de riego Pesillo-Imbabura</p> <p><b>Problemas y soluciones implementadas:</b> Aun no hay solicitudes de transferencias</p>	Carlos Buitrón Técnico de infraestructura civil	31/01/2018
Febrero, 2018:	<p><b>Avances:</b> El proyecto Pesillo-Imbabura, sigue con la programación y cronograma presentado a las distintos ente de gobierno e involucrados</p> <p><b>Problemas y soluciones implementadas:</b> En este año aun no hay solicitud de transferencia de recursos para continuar con el proyecto</p>	Carlos Buitrón Técnico de infraestructura civil	28/02/2018
marzo, 2018:	<p><b>Avances:</b> El proyecto Pesillo-Imbabura, sigue con la programación y cronograma presentado a las distintos ente de gobierno e involucrados</p> <p><b>Problemas y soluciones implementadas:</b> No aplica</p>	Carlos Buitrón Técnico de infraestructura civil	30/03/2018
abril 2018:	<p><b>Avances:</b> El proyecto Pesillo-Imbabura, sigue con la programación y cronograma presentado a las distintos ente de gobierno e involucrados</p> <p><b>Problemas y soluciones implementadas:</b> No aplica</p>	Carlos Buitrón Técnico de infraestructura civil	30/04/2018
